41-12-2348-14-021 DHHU 26.00 Türen gemäß Bestandserfassung
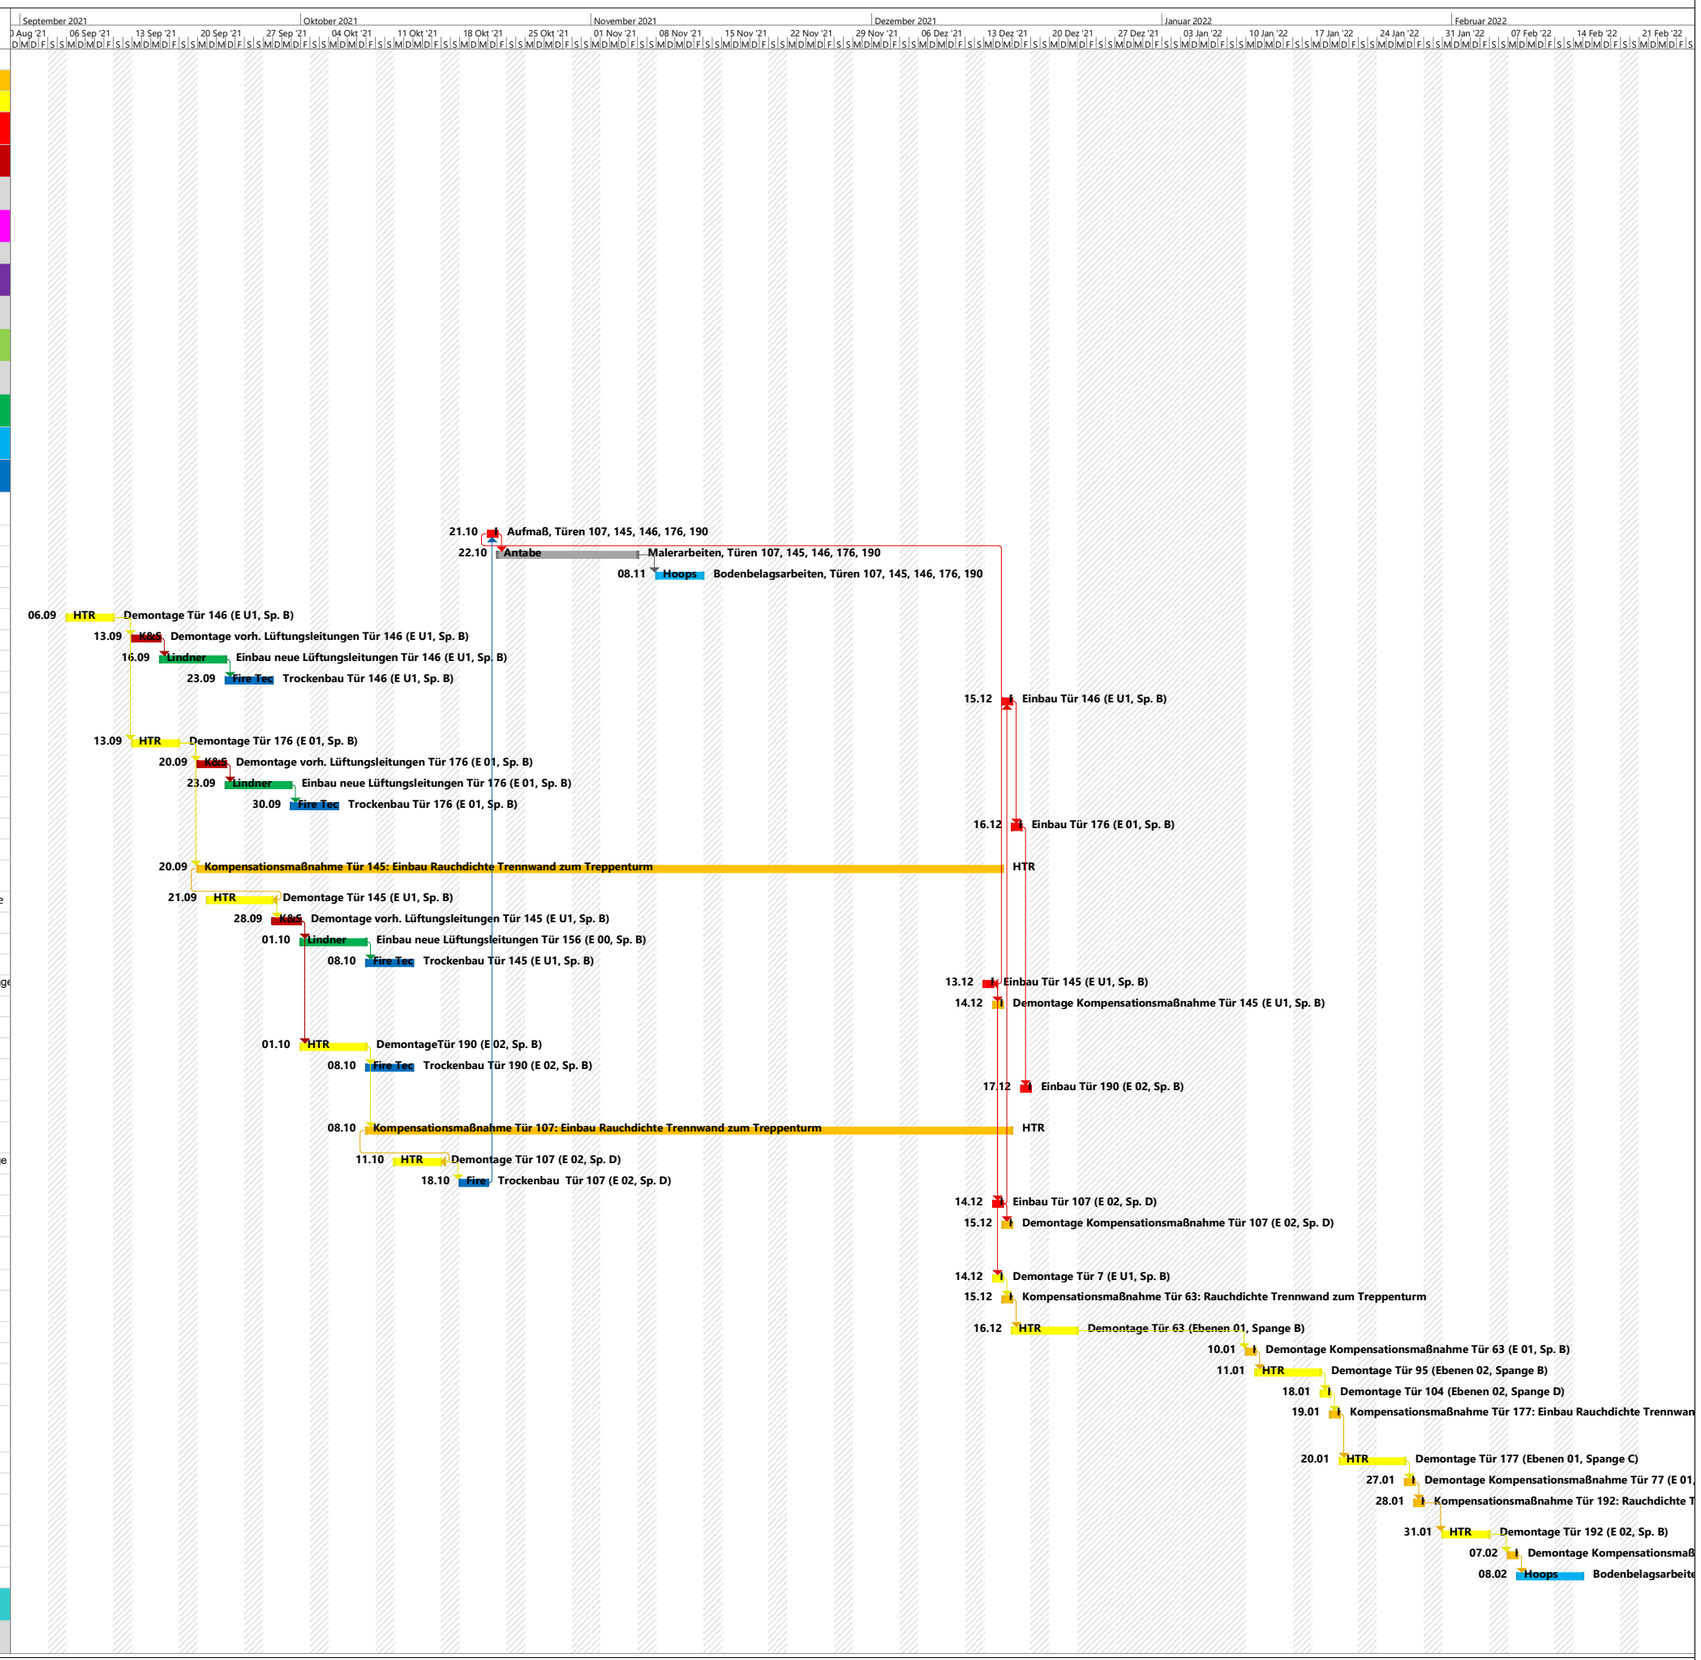
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger
1	Abstimmungsgespräch mit HHU	1 Tag	Mon 23.04.18	Mon 23.04.18	
2	**Phase 1: Türen 47, 51, 165, 166, 167 (Ebene 00, Spange D)**				
35	**Zusätzliche Arbeiten:**				
44	**Phase 2: Türen 153, 158, 160, 184, 185 (Ebenen 00, 01, Spangen A, B, C, D)**				
70	**Phase 3: Türen 144, 149, 150, 163, 168 (Ebenen U1 / 00, Spangen B / C / D)**				
97	**Phase 3 Abbruch ohne Ersatz: Türen 45, 46, 50, 147, 148, 193, 194, 196 (E U1 / 00 / 02 / 03, Sp. C / D)**				
116	**Phase 4: Türen 79, 53, 156, 161, 164 (Ebenen 00/01, Spangen B / C / D / E)**				
142	**Phase 4 Abbruch ohne Ersatz: Türen 4, 6, 159 (E U1 / 00, Sp. B / C)**				
152	**Phase 5: Türen 22, 157, 179, 181, 186 (Ebenen U1, 00, 01 Spangen B, C, D)**				
185	**Phase 5 Abbruch ohne Ersatz: Türen 34, 82, 180 (E 00 / 01, Sp. B / C /D)**				
193	**Phase 6: Türen 17, 106 169, 183, 195 (Ebenen U1 / 00 / 01 / 02 Spangen D / E)**				
227	**Phase 6 Abbruch ohne Ersatz: Türen 76, 77, 162, (Ebenen 00 / 01, Spangen C / D)**				
234	**Phase 7: Türen 83, 174, 178, 182, 197 (Ebenen 01 / 03, Spangen B / C / D)**				
261	**Phase 8: Türen 103, 120, 175, 189, 191 (Ebenen 01 / 02 / 03, Spangen B / D)**				
291	**Phase 9: Türen 107, 145, 146, 176, 190 (Ebenen U1 / 01 / 02, Spangen B / D)**				
292	**Türen 107, 145, 146, 176, 190 (Ebenen U1 / 01 / 02, Spangen B / D)**				
293	Aufmaß, Türen 107, 145, 146, 176, 190	1 Tag	Don 21.10.21	Don 21.10.21	323
294	Malerarbeiten, Türen 107, 145, 146, 176, 190	10 Tage	Fre 22.10.21	Fre 05.11.21	293
295	Bodenbelagsarbeiten, Türen 107, 145, 146, 176, 190	5 Tage	Mon 08.11.21	Fre 12.11.21	294
296	**Tür 146 (E U1, Sp. B) - EVTL. KOLLISION LÜFTUNGSLEITUNGEN**				
297	Demontage Tür 146 (E U1, Sp. B)	5 Tage	Mon 06.09.21	Fre 10.09.21	
298	Demontage vorh. Lüftungsleitungen Tür 146 (E U1, Sp. B)	3 Tage	Mon 13.09.21	Mit 15.09.21	297
299	Einbau neue Lüftungsleitungen Tür 146 (E U1, Sp. B)	5 Tage	Don 16.09.21	Mit 22.09.21	298
300	Trockenbau Tür 146 (E U1, Sp. B)	3 Tage	Don 23.09.21	Mon 27.09.21	299
301	Einbau Tür 146 (E U1, Sp. B)	1 Tag	Mit 15.12.21	Mit 15.12.21	324
302	**Tür 176 (E 01, Sp. B) KOLLISION LÜFTUNGSLEITUNGEN**				
303	Demontage Tür 176 (E 01, Sp. B)	5 Tage	Mon 13.09.21	Fre 17.09.21	297
304	Demontage vorh. Lüftungsleitungen Tür 176 (E 01, Sp. B)	3 Tage	Mon 20.09.21	Mit 22.09.21	303
305	Einbau neue Lüftungsleitungen Tür 176 (E 01, Sp. B)	5 Tage	Don 23.09.21	Mit 29.09.21	304
306	Trockenbau Tür 176 (E 01, Sp. B)	3 Tage	Don 30.09.21	Mon 04.10.21	305
307	Einbau Tür 176 (E 01, Sp. B)	1 Tag	Don 16.12.21	Don 16.12.21	301
308	**Tür 145 (E U1, Sp. B) - EVTL. KOLLISION LÜFTUNGSLEITUNGEN**				
309	Kompensationsmaßnahme Tür 145: Einbau Rauchdichte Trennwand zum Treppenturm	61 Tage	Mon 20.09.21	Die 14.12.21	303
310	Demontage Tür 145 (E U1, Sp. B)	5 Tage	Die 21.09.21	Mon 27.09.21	309AE+6 Tage
311	Demontage vorh. Lüftungsleitungen Tür 145 (E U1, Sp. B)	3 Tage	Die 28.09.21	Don 30.09.21	310
312	Einbau neue Lüftungsleitungen Tür 156 (E 00, Sp. B)	5 Tage	Fre 01.10.21	Don 07.10.21	311
313	Trockenbau Tür 145 (E U1, Sp. B)	3 Tage	Fre 08.10.21	Die 12.10.21	312
314	Einbau Tür 145 (E U1, Sp. B)	1 Tag	Mon 13.12.21	Mon 13.12.21	293AE+37 Tage
315	Demontage Kompensationsmaßnahme Tür 145 (E U1, Sp. B)	1 Tag	Die 14.12.21	Die 14.12.21	314
316	**Tür 190 (E 02, Sp. B)**				
317	DemontageTür 190 (E 02, Sp. B)	5 Tage	Fre 01.10.21	Don 07.10.21	311
318	Trockenbau Tür 190 (E 02, Sp. B)	3 Tage	Fre 08.10.21	Die 12.10.21	317
319	Einbau Tür 190 (E 02, Sp. B)	1 Tag	Fre 17.12.21	Fre 17.12.21	307
320	**Tür 107 (E 02, Sp. D)**				
321	Kompensationsmaßnahme Tür 107: Einbau Rauchdichte Trennwand zum Treppenturm	48 Tage	Fre 08.10.21	Mit 15.12.21	317
322	Demontage Tür 107 (E 02, Sp. D)	5 Tage	Mon 11.10.21	Fre 15.10.21	321AE+6 Tage
323	Trockenbau Tür 107 (E 02, Sp. D)	3 Tage	Mon 18.10.21	Mit 20.10.21	322
324	Einbau Tür 107 (E 02, Sp. D)	1 Tag	Die 14.12.21	Die 14.12.21	314
325	Demontage Kompensationsmaßnahme Tür 107 (E 02, Sp. D)	1 Tag	Mit 15.12.21	Mit 15.12.21	324
326	**Phase 9 Abbruch ohne Ersatz: Türen 7, 63, 95, 104, 177, 192 (E U1 / 01 / 02, Sp. B / C / D)**				
327	Demontage Tür 7 (E U1, Sp. B)	1 Tag	Die 14.12.21	Die 14.12.21	314
328	Kompensationsmaßnahme Tür 63: Rauchdichte Trennwand zum Treppenturm	1 Tag	Mit 15.12.21	Mit 15.12.21	327
329	Demontage Tür 63 (Ebenen 01, Spange B)	5 Tage	Don 16.12.21	Mit 22.12.21	328
330	Demontage Kompensationsmaßnahme Tür 63 (E 01, Sp. B)	1 Tag	Mon 10.01.22	Mon 10.01.22	329
331	Demontage Tür 95 (Ebenen 02, Spange B)	5 Tage	Die 11.01.22	Mon 17.01.22	330
332	Demontage Tür 104 (Ebenen 02, Spange D)	1 Tag	Die 18.01.22	Die 18.01.22	331
333	Kompensationsmaßnahme Tür 177: Einbau Rauchdichte Trennwand oberhalb Achse 71, so dass der Treppenraum 26.33.01 / QS C über die Fluchtbalkone erreichbar bleibt.	1 Tag	Mit 19.01.22	Mit 19.01.22	332
334	Demontage Tür 177 (Ebenen 01, Spange C)	5 Tage	Don 20.01.22	Mit 26.01.22	333
335	Demontage Kompensationsmaßnahme Tür 77 (E 01, Sp. C)	1 Tag	Don 27.01.22	Don 27.01.22	334
336	Kompensationsmaßnahme Tür 192: Rauchdichte Trennwand zum Treppenturm	1 Tag	Fre 28.01.22	Fre 28.01.22	335
337	Demontage Tür 192 (E 02, Sp. B)	5 Tage	Mon 31.01.22	Fre 04.02.22	336
338	Demontage Kompensationsmaßnahme Tür 192 (E 02, Sp. B)	1 Tag	Mon 07.02.22	Mon 07.02.22	337
339	Bodenbelagsarbeiten, Türen 7, 63, 95, 104, 177, 192	5 Tage	Die 08.02.22	Mon 14.02.22	338
340	**Phase 10: Türen 31, 152, 155, 172, 176 (Ebenen 00 / 01, Spangen A / B)**				
363	**Phase 10 Abbruch ohne Ersatz: Türen 142, 143, 151, 154, 170, 173, 187, 188 (Ebenen U1 / 00 / 01 / 02, Spange A)**
